Индивидуальный предприниматель
Загайнов Андрей Игоревич
Разработка программного обеспечения

ОГРНИП **321420500066892** ИНН **422206816294**
Адрес: 108829, Россия, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, кв-л 121, д. 57
Тел.: **+7 905 908-67-77** E-mail: ipzagainovihor@yandex.ru
Сайт: **andreizagainov.ru**

Исх. № 129 от 10.11.2026 г. (редакция 2)

ООО «Эльбрус Дриллинг»
Закупка № 4638593 на B2B-Center

Коммерческое предложение: система оперативного планирования буровых бригад


1. Что получит заказчик

Единую веб-систему для отдела кадров и администраторов буровых, которая объединяет факт из 1С:ЗУП с рабочим планом до конца года и в любой момент отвечает на три вопроса из технического задания: хватает ли людей нужных должностей на каждом объекте, кто и почему закрывает потребность, какими будут годовые часы, переработка и расходы.

Все требования ТЗ (редакция 4) входят в базовую стоимость: модель потребностей и назначений, календарный табель, массовые операции, подбор подмены, планируемые отсутствия и их сопоставление с 1С, оценка стоимости дополнительных работ, прогноз переработки и доплаты, варианты плана, допуски и медосмотры, роли и история изменений, обязательные отчёты, односторонняя интеграция с 1С:ЗУП.

2. Прототип основного календаря

К предложению приложен рабочий прототип интерфейса (файл «Прототип планировщика буровых бригад.html», открывается в браузере). Он показывает плотный табель на 26+ сотрудников объекта с закреплёнными ФИО, датами, годовыми итогами и строкой комплектности; защиту факта из 1С; заполнение циклом работы и отдыха и «как у сотрудника» с предпросмотром и отменой; мгновенный пересчёт часов, переработки, доплаты и некомплекта; пул подменных с проверкой допусков; список рисков.

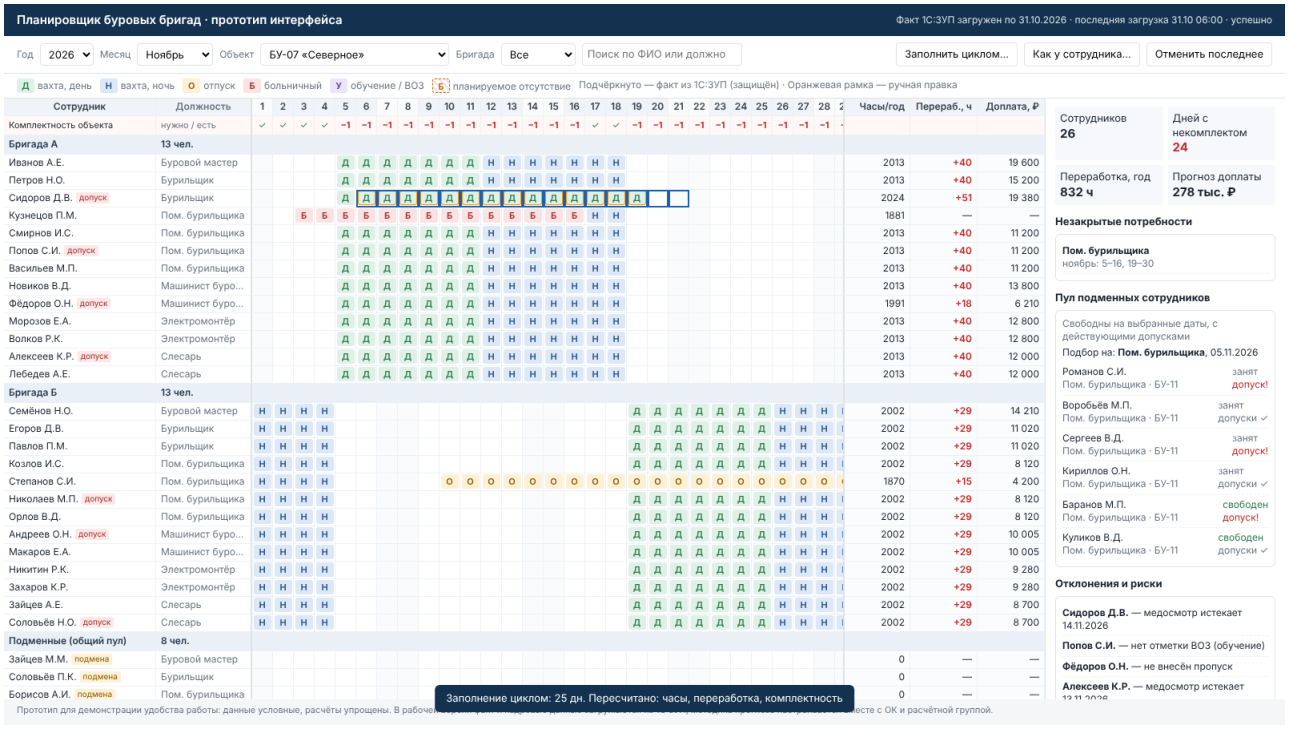

3. Архитектура и интеграция

- **Решение:** отдельное веб-приложение (не конфигурация 1С). Работа в браузере, без установки на рабочие места.
- **Технологии:** Python (серверная часть), PostgreSQL (база данных), современный веб-интерфейс на JavaScript. Без платных лицензий.
- **Размещение:** на сервере заказчика (рекомендуем) или в облаке в РФ. Персональные данные остаются в контуре заказчика.
- **Интеграция:** односторонний обмен из 1С:ЗУП по расписанию через стандартные механизмы 1С (OData или HTTP-сервис). Кадровые данные в планировщике — только для просмотра; при новой загрузке система сопоставляет данные, показывает расхождения и не удаляет сделанные назначения. Дата и результат последней загрузки видны пользователю.
- **Доступ:** роли «Администратор буровой», «Специалист ОК», «Руководитель/наблюдатель», «Администратор системы»; ограничение доступа по проекту, буровой или группе объектов; полная история изменений; защита от «молчаливой» перезаписи при одновременной работе.
- **Эксплуатация:** журнал ошибок, ежедневное резервное копирование, инструкция по обновлению и восстановлению.

4. Этапы, сроки и стоимость

Цены указаны без НДС (сравнение заявок — без НДС). Исполнитель применяет УСН, НДС 5% начисляется сверху.

Этап	Срок	Стоимость, ₽ без НДС
1. Обследование, уточнение методики на реальных Excel-файлах, проектирование	2 недели	210 000
2. Ядро: модель данных, роли, история, интеграция с 1С:ЗУП	3 недели	590 000
3. Календарный планировщик, массовые операции, подбор подмены, допуски	3 недели	560 000
4. Расчёты (часы, переработка, доплата, доп. работы), варианты плана, отчёты	3 недели	520 000
5. Перенос начального плана, тестирование по сценариям приёмки, обучение, ввод в эксплуатацию	2 недели	320 000
Итого базовая версия	**13 недель**	**2 200 000**

Срок 13 недель — с запасом; при оперативных ответах со стороны заказчика возможна сдача раньше. Приёмка — по этапам, по сценариям из раздела «Проверочные сценарии» ТЗ.

Стоимость действует при условиях оплаты и работы, указанных в разделе 7 (оплата каждого этапа — в течение 30 календарных дней после подписания акта этапа).

5. Отдельные опции (не входят в базовую стоимость)

Опция	Стоимость, ₽ без НДС
Автоматическое построение оптимального графика с учётом норм, отдыха и допусков	650 000
Расширенные аналитические панели (дашборды по объектам, проектам и компании)	350 000
Техническая поддержка и развитие после ввода (до 30 ч/мес, реакция в течение рабочего дня). Отдельный договор; оплата ежемесячно, не позднее 30 календарных дней после подписания акта за месяц	95 000 / мес
Лицензии стороннего ПО	не требуются

6. Команда и участие заказчика

- **Исполнитель:** руководитель проекта и архитектор — Загайнов А. И. (опыт руководства IT-компанией и разработкой информационной системы с ролевой моделью и мобильными приложениями, 2020–2023); разработка серверной и клиентской части; тестирование.
- **Заказчик:** ответственный специалист ОК (2–3 часа в неделю на этапах 1, 4, 5); доступ к тестовой базе 1С:ЗУП и специалист 1С для публикации стандартного интерфейса выгрузки по нашей инструкции; действующие Excel-файлы планирования; образец печатной формы графика; сервер (требования предоставим на этапе 1).
- **Формат работы:** все работы, обследование и обучение — удалённо (видеосвязь, удалённый доступ). Для соблюдения сроков заказчик оперативно предоставляет доступы, ответы на вопросы и назначает ответственное контактное лицо.

7. Исходные данные и ограничения оценки

- Оценка выполнена по ТЗ «Система оперативного планирования буровых бригад», редакция 4, и приложениям (макеты экранов).
- Масштаб: 18 буровых установок, около 2 000 сотрудников, до 50 бригад; число одновременных пользователей и целевые показатели отклика фиксируются после обследования.
- Обратное оформление документов в 1С не входит (как указано в ТЗ).
- **Условия цены:** стоимость базовой версии 2 200 000 ₽ без НДС действует при оплате каждого этапа в течение 30 календарных дней после подписания акта этапа. При оплате по условиям закупки (постоплата 90 дней) стоимость базовой версии — 2 750 000 ₽ без НДС.
- **Досрочная сдача:** этап, сданный досрочно, заказчик принимает и оплачивает в общем порядке; досрочная сдача не является основанием для требования дополнительных работ сверх ТЗ.
- **Взаимодействие:** работы выполняются удалённо; заказчик предоставляет доступы, ответы и согласования в течение 1 рабочего дня; срок исполнителя продлевается на время задержек со стороны заказчика.
- **Изменения ТЗ:** любые изменения и дополнения сверх ТЗ (редакция 4) — по дополнительному соглашению и за отдельную плату.
- **Техническая поддержка:** оформляется отдельным договором с ежемесячной оплатой в течение 30 календарных дней после подписания акта.

8. Почему мы

- Рабочий прототип календаря уже сделан под ваше ТЗ — его можно посмотреть до выбора исполнителя.
- Цена ниже рыночной для такого объёма при полном покрытии требований.
- Работаем официально как ИП: договор, акты, ЭДО.

Индивидуальный предприниматель
Загайнов Андрей Игоревич
ОГРНИП 321420500066892, ИНН 422206816294

